





Plan d'action final

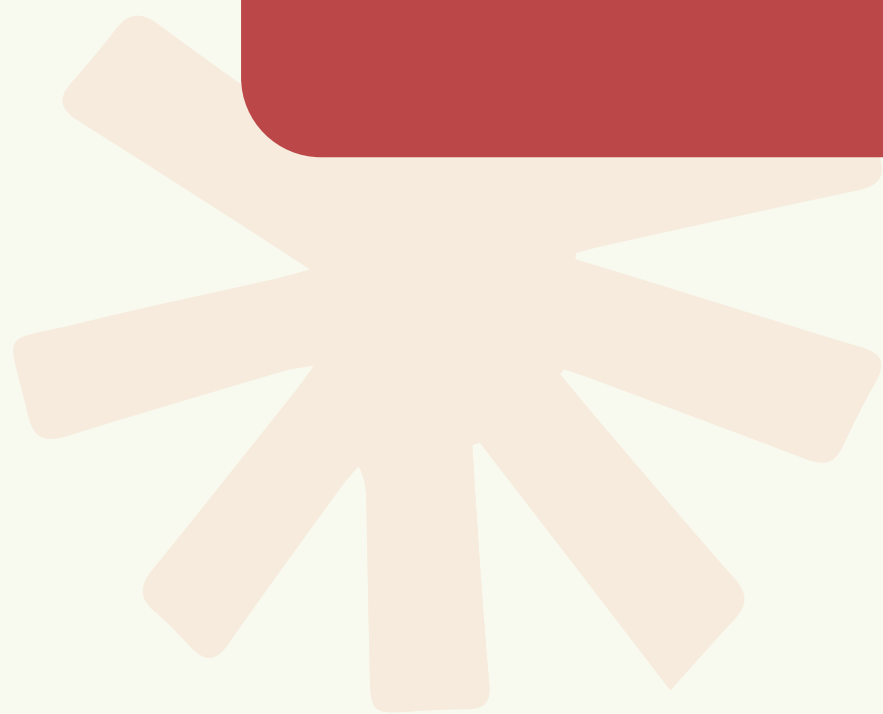

Implantation & indicateurs de succès


SPrint 4






Plan d'implantation

- Étapes du déploiement
- Migration des données
- Tests du système
- Échéancier du déploiement
- Projet pilote
- Gestion des risques
- Plan B / support rapide
- Suivi post-implantation
- Indicateurs de succès (KPI)



Étapes	Description	Objectifs
Préparation	Validation des besoins des départements, configuration de SAP Business One, préparation de l'infrastructure informatique et nettoyage des données existantes.	Préparer l'entreprise et le système afin de réduire les risques, éviter les problèmes techniques et assurer un déploiement stable et efficace.
Migration des données	Suppression des doublons, validation des données, sauvegardes complètes et tests avant la mise en production.	Assurer l'intégrité des données et réduire les risques de perte ou d'erreurs durant la migration.
Projet pilote	Déploiement initial dans le département des ventes pour tester le système en conditions réelles.	Identifier les problèmes techniques, recueillir les commentaires des utilisateurs et ajuster les processus avant le déploiement global.
Ajustement	Correction des problèmes détectés, optimisation des processus et adaptation des formations selon les difficultés rencontrées.	Limiter les impacts négatifs et améliorer le système avant l'implantation complète.
Déploiement global	Déploiement progressif par département : ventes et marketing, services professionnels, finances et RH, puis déploiement final complet.	Assurer une implantation progressive et réduire les interruptions de service tout en offrant un accompagnement TI renforcé.
Suivi post-implantation	Support continu, ajustements selon les commentaires des utilisateurs et analyse des indicateurs de performance.	Mesurer le succès du projet et assurer l'amélioration continue du système.

Échéancier du déploiement

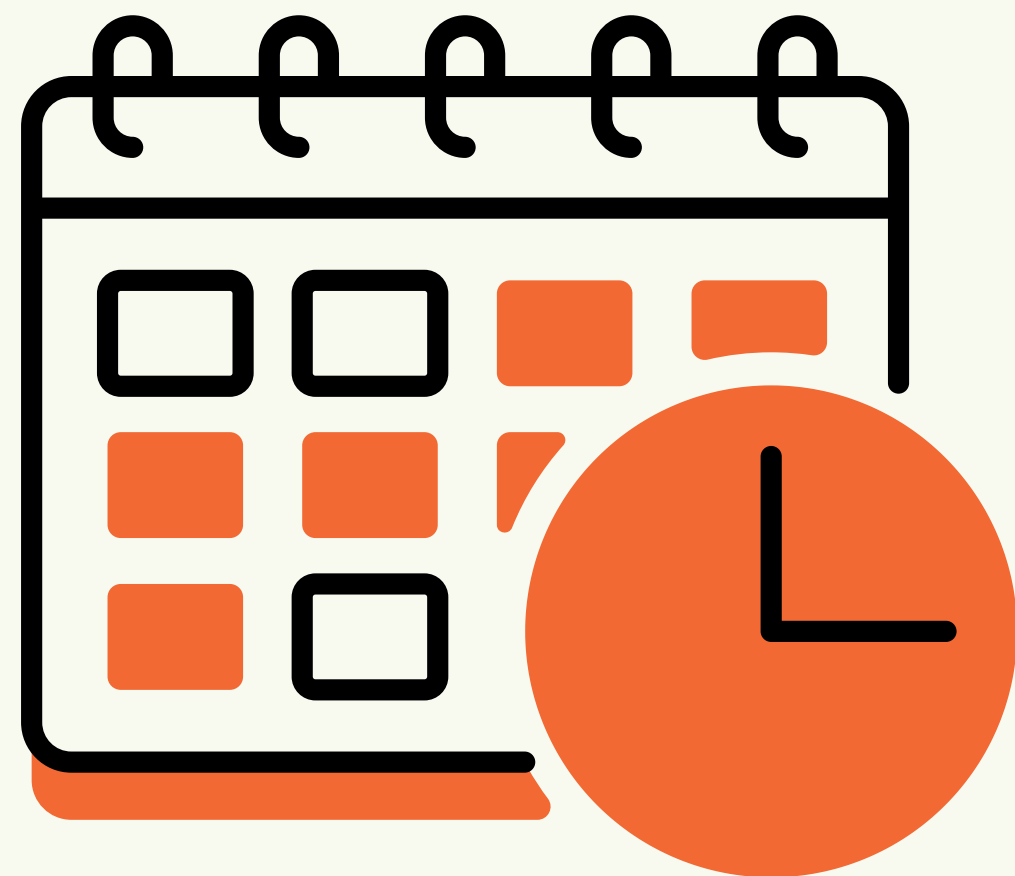


Phase	Durée
Préparation	Semaine 1
Migration et tests	Semaine 2
Projet pilote ventes	Semaine 3
Ajustements	Semaine 4
Déploiement progressif	Semaines 5-6
Suivi post-implantation	Semaines 7-8



Plan B en cas de problèmes

- En cas de problème critique, l'entreprise pourra temporairement revenir aux anciens outils afin d'assurer la continuité des opérations.
- conservation des anciennes données pendant la transition ;
- environnement de test séparé avant production.

Risque	Impact	Solution
Perte de données	Élevé	Sauvegardes (backup) et tests
Interruption de service	Moyen	Déploiement progressif
Résistance au changement	Élevé	Super users et accompagnement
Mauvaise utilisation du système	Moyen	Formation continue
Surcharge du support TI	Moyen	Helpdesk et tickets



Indicateurs de succès



- Indicateurs de succès globaux (KPI)
- Indicateurs de succès par départements

Catégorie	Indicateur de succès (KPI)	Description	Méthode de mesure	Objectif cible
Adoption	Taux d'adoption des utilisateurs	Pourcentage d'employés utilisant activement le ERP	(Nb utilisateurs actifs / Nb utilisateurs ciblés) × 100	≥ 85 %
Adoption	Taux de complétion des formations	Employés ayant terminé la formation ERP	Registre des formations	100%
Performance opérationnelle	Réduction du nombre d'erreurs	Diminution des erreurs administratives et opérationnelles	Comparaison avant/après implantation	-40%
Performance opérationnelle	Temps de traitement des commandes	Rapidité d'exécution des commandes	Temps moyen par commande	Réduction de 30 %
Performance opérationnelle	Exactitude des inventaires	Concordance entre inventaire physique et système	Audit d'inventaire	≥ 98 %
Satisfaction des utilisateurs	Taux de satisfaction des utilisateurs	Niveau de satisfaction général des employés	Sondage interne	≥ 80 %
Performance financière	Retour sur investissement (ROI)	Comparaison coûts/bénéfices du projet ERP	Analyse financière	ROI positif
Performance financière	Réduction des coûts opérationnels	Économies réalisées grâce au ERP	Analyse budgétaire	Réduction mesurable
Qualité des données	Fiabilité des données	Exactitude des informations dans le système	Audit des données	≥ 95 %
Gestion de projet	Disponibilité du système	Temps où SAP Business One est fonctionnel	Taux de disponibilité	≥ 99 %

Département	% d'adoption	Nombre d'erreurs	Satisfaction des utilisateurs
Ventes et marketing	environ 90 % des vendeurs utilisent SAP Business One pour gérer les leads et les clients.	réduction des doublons et des informations clients manquantes (objectif : 0 doublon).	satisfaction moyenne d'environ 4/5 concernant l'utilisation mobile et le suivi des opportunités.
Services professionnels / Consultants	environ 90 % des consultants utilisent SAP pour le suivi des projets et des feuilles de temps.	diminution des erreurs dans les tâches, projets et données de facturation.	satisfaction moyenne de 4/5 sur l'utilisation des outils de gestion de projets.
Comptabilité et facturation	utilisation complète du module financier par l'équipe comptable.	réduction des erreurs de facturation et des doublons dans les données financières.	satisfaction moyenne de 4/5 concernant les rapports et la facturation.
Ressources humaines	forte participation des employés aux outils RH et formations SAP.	réduction des erreurs liées aux informations des employés et aux accès.	satisfaction moyenne de 4/5 concernant le soutien et l'accompagnement reçus.
Gestionnaires	utilisation régulière des tableaux de bord et KPI par les gestionnaires.	diminution des problèmes de communication et de suivi entre les équipes.	satisfaction moyenne de 4/5 concernant la visibilité et le suivi des opérations.
Équipe TI	utilisation stable des outils SAP et des procédures internes de support.	diminution des incidents techniques et des problèmes d'accès.	satisfaction moyenne de 4/5 envers le support technique offert.



MERCI !
